


068 Kindergarten Gottenheim

Übersicht Gebäude + Außen + MFP (EUR mit USt.)

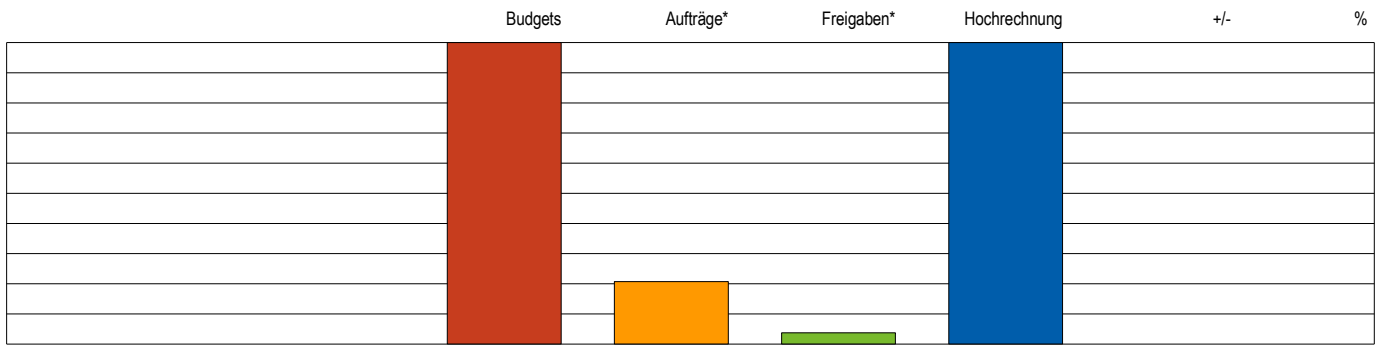

	Budgets	Aufträge*	Freigaben*	Hochrechnung
Summe	4.280.000	885.641	159.930	4.280.000
G Gebäude KiGa	3.660.000	759.818	146.872	3.660.000
200 Herrichten und Erschließen	49.066			49.066
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.956.837			1.956.837
400 Bauwerk - Technische Anlagen	719.403			719.403
600 Ausstattung und Kunstwerke	152.040			152.040
700 Baunebenkosten	782.654	759.818	146.872	782.654
A Außenanlagen und Vorplatz	525.000	105.332	11.635	525.000
500 Außenanlagen	418.050			418.050
700 Baunebenkosten	106.950	105.332	11.635	106.950
M Multifunktionsplatz (Kleinspielfeld)	95.000	20.491	1.423	95.000
500 Außenanlagen	71.953			71.953
700 Baunebenkosten	23.047	20.491	1.423	23.047

Legende: Aufträge* = einschl. Rückstellungen, Freigaben* = einschl. Einbehalte, ! = abgeschlossen
